

# 深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135007194




第 1 页 共 6 页

项目名称: 交通监控中心办公楼修缮工程  
项目编号: SZCG2012037780  
合同编号: SZHT(2013)001103  
采购单位: 深圳市公安局交通警察局  
供应商: 广东爱得威建设(集团)股份有限公司  
验收委托机构: 深圳市政府采购中心  
验收检验机构: 深圳市计量质量检测研究院



(检验专用章)

签发日期: 2013年12月27日

签发人:   
审核:   
主检: 




# 政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135007194

第 2 页 共 6 页

## 一、总表名称

项目名称	交通监控中心办公楼修缮工程		
采购单位	深圳市公安局交通警察局		
中标供应商	广东爱得威建设(集团)股份有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2012037780	现场验收日期	2013 年 12 月 16 日
现场验收地点	深圳市公安局交通警察局交通监控中心办公楼	环境条件	(15~18)℃, (50~70)%RH
现场验收依据	政府采购项目抽检验收方案、采购合同及项目招投标文件。		
抽检结果及建议	<p>在抽检现场,甲方未提供《交通监控中心办公楼修缮工程验收证明》,该项目未组织验收。</p> <p>通过对交通监控中心办公楼修缮工程项目的现场抽样检查,发现以下几方面与项目招投标文件的要求不符合。</p> <p>一. 大堂新增宣传栏</p> <p>1. 未见监控中心宣传栏,与招投标文件规定不符。</p> <p>二. 二层餐厅包房装饰</p> <p>1. 造型屏风未涂白色漆,与招投标文件规定不符。</p> <p>2. 餐厅地面为(600×600)mm 地砖,与招投标文件规定的(800×800)mm 米白色优质抛光砖不符。</p> <p>3. 餐厅包房装饰未见镜子油图案墙饰面、车边眼镜饰面、造型饰面线条、艺术挂画及墙面暗藏灯管。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       检验机构代表签字: <u>陈松</u>                      2013年12月16日                 </div>		

# 政府采购项目抽检验收报告

报告编号：135007194

第 3 页 共 6 页

## 二、商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	4.1 交货及完成安装的期限	签订合同后 70 个日历日内交货并完成安装。	工程未完工验收	——
2	4.2 数量、规格型号	应符合采购合同中“深圳市公安局交通警察局交通监控中心办公楼修缮装修工程合同”所规定的要求。	部分规格型号与合同不一致	——
3	4.3 质量合格凭证或文件	供应商应提供产品的质量合格凭证或文件。	提供了部分产品的质量合格凭证	——
4	4.4 产品保修及其他服务文件	供应商应提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料,并提供由产品生产厂家签署承诺的合法、有效的保修、维修证明,该证明应符合合同规定的要求。	未提供产品使用说明书、原厂保修卡等附随资料	——

## 政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135007194

第 4 页 共 6 页

### 三、技术要求

货物名称: 办公楼装修工程

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
1	瓷砖楼地面	瓷砖 800mm*800mm	(800×800) mm	符合
2	块料踢脚线	踢脚线高度 100mm	100mm 踢脚线	符合
3	天棚吊顶	新做铝扣板天棚面层	符合要求	符合
4	新做实木平开门	新做实木平开门	符合要求	符合
5	翻新窗台板	翻新窗台板接近木门颜色	无法确认	——
6	窗框翻新	窗框翻新接近门颜色	无法确认	——
7	更换照明电线	更换照明电线	无法确认	——
8	更换照明灯管	更换照明灯管	符合要求	符合
9	更换插座	更换插座	符合要求	符合
10	更换照明开关	双联照明开关安装	符合要求	符合

货物名称: 大堂新增宣传栏

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
1	监控中心宣传栏	1. 宣传栏规格: 5m*7m*1m 2. 基层材料: 镀锌角钢骨架 3. 面层: 4.0m 厚铝塑板	未见监控中心宣传栏	不符合

货物名称: 食堂厨房防水工程

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
1	隔墙防水及墙面恢复	墙面恢复, 面层粘贴瓷砖。	无法确认	——
2	地板防水及地板恢复	地板恢复, 面层粘贴瓷砖。	无法确认	——

## 政府采购项目抽检验收报告


报告编号：135007194

第 5 页 共 6 页


货物名称：二层餐厅包房装饰

序号	检测项目	技术要求	实测情况	单项结论
1	造型屏风	1. 规格：1550mm*2750mm 2. 木饰面索白色漆	(1620×2370) mm 未涂白色漆（见附图 1）	不符合 不符合
2	800x800 米白色优质抛光砖	800x800 米白色抛光砖	(600×600)mm 地砖（见附图 2）	不符合
3	镜子油图案墙饰面	1. 木饰面索白色漆边框宽 65mm 2. 镜子油图案	未见镜子油图案墙饰面	不符合
4	车边眼镜饰面	1. 木饰面索白色漆边框宽 65mm 2. 车边眼镜饰面	未见车边眼镜饰面	不符合
5	造型装饰线条	1. 装饰线条宽：420mm 2. 金箔饰面 200mm 3. 木饰面索白色漆线条	未见造型装饰线条	不符合
6	木饰面索白色漆踢脚线	踢脚线高度 100mm	100mm 踢脚线	符合
7	艺术挂画	尺寸：2800mm*1250mm	未见艺术挂画	不符合
8	艺术吊灯	具体详见设计	符合要求	符合
9	天棚暗藏灯管	具体详见设计	符合要求	符合
10	墙面暗藏灯管	具体详见设计	未见墙面暗藏灯管	不符合

#### 四、检测现场照片

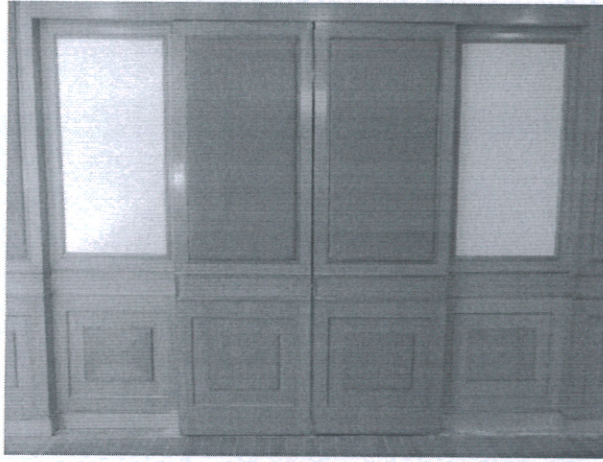

附图 1

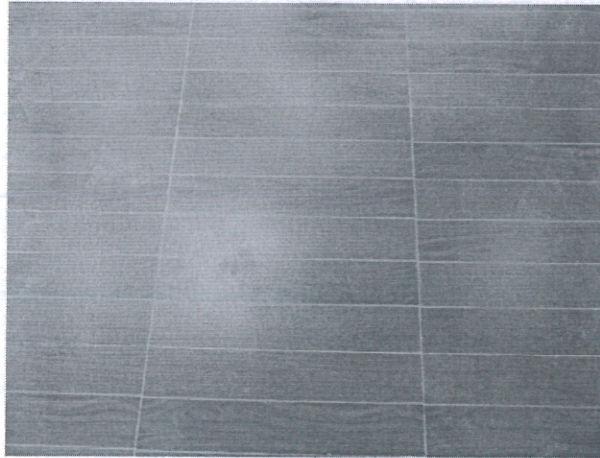

附图 2

验收合格
