

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 1 页 共 9 页

项目名称: 深圳市高级中学新艺术楼装饰工程
项目编号: SZCG2013039191
合同编号: SZHT (2013) 001831
采购单位: 深圳市高级中学
供应商: 深圳市毅恒达装饰设计工程有限公司
验收委托机构: 深圳市政府采购中心
验收检验机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2013 年 12 月 30 日

签发人: 李大圣
审核: 杨泓号
主检: 袁东行




政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 2 页 共 9 页

一、总表名称

项目名称	深圳市高级中学新艺术楼装饰工程		
采购单位	深圳市高级中学		
中标供应商	深圳市毅恒达装饰设计工程有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2013039191	现场验收日期	2013 年 12 月 02 日
现场验收地点	深圳市高级中学新艺术楼	环境条件	(19~25) °C, (50~70) %RH
现场验收依据	政府采购项目抽检验收方案、招标文件及采购合同。		
抽检结果及建议	<p>经现场抽检, 发现部分项目与《政府采购项目抽检验收方案》、招标文件及采购合同中的规定不符, 具体情况如下:</p> <p>一、电气电路部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音乐教室 204、208, 舞蹈教室 307、308 现场未见筒形钢架灯及双管荧光灯。 2. 多功能厅现场未见双管荧光灯及天花射灯。 <p>二、装饰装修部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经现场查点, 实木装饰门数量与招标文件不符。 2. 音乐教室、舞蹈教室玻璃纤维天棚面层材质变更。 3. 多功能厅玻璃纤维天棚面层尺寸变更。 4. 三楼舞蹈教室墙柱面装饰材质变更。 5. 三楼舞蹈教室木窗帘盒及窗帘材质变更。 6. 梳妆台现场未见。 <p>三、室内空气质量部分</p> <p>201 教室录音室、控制室室内空气甲醛含量与国家标准要求不符。 具体检测结果详见验收报告。</p> <p>另外, 甲方还未对该项目组织验收。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 检验机构代表签字:  2013 年 12 月 2 日 </p>		

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 3 页 共 9 页

二、商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	4.1 交货及完成安装的期限	签订合同后 30 个日历日内交货并完成安装	甲方未验收	——
2	4.2 数量、规格型号	应符合采购合同中“深圳市高级中学新艺术楼装饰工程合同”所规定的要求。	甲方未验收	——
3	4.3 质量合格凭证或文件	供应商应提供产品的质量合格凭证或文件。	甲方未验收	——
4	4.4 产品保修及其他服务文件	供应商应提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料, 并提供由生产厂家签署承诺的合法、有效的保修、维修证明, 该证明应符合合同规定的要求。	甲方未验收	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 4 页 共 9 页

三、技术要求

新艺术楼二楼音乐教室装饰工程（包括一楼）

序号	样品名称	技术要求	实测结果	单项结论
1	塑料管(PE管) 1.室外塑料给水管安装 (热熔焊) DN150	1.室外塑料给水管安装(热熔焊) DN150	符合要求 Φ=150mm	符合
2	塑料卷材楼地面 1.PVC塑料卷材楼地面	PVC塑料卷材楼地面	符合要求	符合
3	天棚吊顶 1 1.平面不上人型装配式 T型轻钢天棚龙骨 面层 规格 600×600 2.铝合金扣板天棚	1. 面层规格 600×600 2. 铝合金扣板天棚	206室: 600×600 207室: 600×600 符合要求	符合
4	天棚吊顶 2 1.跌级不上人型装配式 U型轻钢天棚龙骨 面层 规格 600×600 2.石膏板天棚基层	1. 面层规格 600×600 2. 石膏板天棚基层	208室: 600×600 204室: 600×600 符合要求	符合
5	天棚吊顶 3 1.平面不上人型装配式 U型轻钢天棚龙骨 面层 规格 600×600 2.玻璃纤维板天棚面层 搁放型	1 面层规格 600×600 2. 玻璃纤维板天棚面层 搁放型	现场未见	——
6	实木装饰门(实木门框、 门扇;五金全套) 1.单开、双开共 41 樘	1. 单开、双开共 41 樘	一楼共 19 樘 二楼共 24 樘 总计: 43 樘 数量和合同不符	不符合
7	装饰灯 1 1.筒形钢架灯安装	1.筒形钢架灯安装	现场未发现	——

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 5 页 共 9 页

8	荧光灯 1 1. 吸顶式 双管荧光灯具安装、T5 灯管、300*1200 灯盘	1. 吸顶式 双管荧光灯具安装、T5 灯管、300*1200 灯盘	现场未发现	—
9	荧光灯 2 1. 吸顶式 三管荧光灯具安装、T5 灯管、600*1200 灯盘	1. 吸顶式 三管荧光灯具安装、T5 灯管、600*1200 灯盘	符合要求	符合
10	小电器 1 1. 2+3 插座	1. 2+3 插座	符合要求	符合
11	小电器 2 1. D2 双语音数据插座	1. D2 双语音数据插座	符合要求	符合
12	小电器 3 1. TV 插座	1. TV 插座	符合要求	符合
13	电气配线 1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	符合要求	符合
14	梳妆台(现场定做)成套化妆台	二楼音乐教室 5 套	现场未见	—
15	室内空气中甲醛	I 类民用建筑工程: 甲醛 ≤ 0.08mg/m ³ (GB50325-2010)	106 室: 0.03 mg/m ³ 201 控制室: 0.15 mg/m ³ 201 录音室: 0.17 mg/m ³ 210 室: 0.05 mg/m ³	符合 不符合 不符合 符合

新艺术楼三楼舞蹈教室装饰工程

序号	样品名称	技术要求	实测情况	单项结论
1	天棚吊顶 1 1. 平面不上人型装配式 T 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2. 铝合金扣板天棚	1. 面层规格 600×600 2. 铝合金扣板天棚	301 室: 600×600 303 室: 600×600 符合要求	符合
2	天棚吊顶 2 1. 跌级不上人型装配式 U 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2. 石膏板天棚基层	1. 面层规格 600×600 2. 石膏板天棚基层	302 室: 600×600 308 室: 600×600 符合要求	符合

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 6 页 共 9 页

3	天棚吊顶 3 1. 平面上上人型装配式 U 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2. 玻璃纤维板天棚面层 搁放型	1. 面层规格 600×600 2. 玻璃纤维板天棚面层 搁放型	现场未见	——
4	装饰板墙面--槽木吸音 面板 1. 墙柱面装饰 玻璃棉 毡隔离层 2. 墙柱面装饰 吸音板 墙面	1. 墙柱面装饰 玻璃棉毡隔离层 2. 墙柱面装饰 吸音板墙面	现场未见	——
5	木窗帘盒及窗帘 1. 窗帘盒 硬木 2. 窗帘轨道 不锈钢管 3. 电动式丝绒幕帘	1. 窗帘盒 硬木 2. 窗帘轨道 不锈钢管 3. 电动式丝绒幕帘	无窗帘盒 轨道为铝合金 无电动式丝绒幕帘 见图一	不符合
6	实木装饰门(实木门框、 门扇;五金全套) 1. 单开、双开共 18 樘	1. 单开、双开共 18 樘	共 13 樘 数量与合同不符	不符合
7	装饰灯 1 1. 筒形钢架灯安装	1. 筒形钢架灯安装	现场未发现	——
8	荧光灯 1 1. 吸顶式 双管荧光灯 具安装、T5 灯管、 300*1200 灯盘	1. 吸顶式 双管荧光灯具安装、T5 灯管、300*1200 灯盘	现场未发现	——
9	小电器 1 1. 2+3 插座	1. 2+3 插座	符合要求	符合
10	小电器 2 1. D2 双语音数据插座	1. D2 双语音数据插座	符合要求	符合
11	小电器 3 1. TV 插座	1. TV 插座	符合要求	符合
12	荧光灯 2 1. 吸顶式 三管荧光灯 具安装、T5 灯管、 600*1200 灯盘	1. 吸顶式 三管荧光灯具安装、T5 灯管、600*1200 灯盘	符合要求	符合

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774

第 7 页 共 9 页

13	电气配线 1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	符合要求	符合
14	梳妆台(现场定做) 成套化妆台	三楼舞蹈教室 5 套	现场未见	——
15	室内空气中甲醛	I 类民用建筑工程: 甲醛 ≤ 0.08mg/m ³ (GB50325-2010)	302 室: 0.03 mg/m ³	符合

新艺术楼四楼多功能厅装饰工程

序号	样品名称	技术要求	实测情况	单项结论
1	塑料卷材楼地面 1.PVC 塑料卷材 楼地面	1. PVC 塑料卷材 楼地面	符合要求	符合
2	天棚吊顶 1 1.平面不上人型装配式 T 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2.铝合金扣板天棚	1. 面层规格 600×600 2. 铝合金扣板天棚	600*600 符合要求	符合
3	天棚吊顶 2 1. 跌级不上人型装配式 U 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2. 石膏板天棚基层	1. 面层规格 600×600 2. 石膏板天棚基层	尺寸无法测量 符合要求	——
4	天棚吊顶 3 1. 平面不上人型装配式 U 型轻钢天棚龙骨 面层规格 600×600 2. 玻璃纤维板天棚面层 搁放型	1. 面层规格 600×600 2. 玻璃纤维板天棚面层 搁放型	1900*913 符合要求 见图二	不符合
5	装饰板墙面—槽木吸音面板 1. 墙柱面装饰 玻璃棉毡隔离层 2. 墙柱面装饰 吸音板墙面	1. 墙柱面装饰 玻璃棉毡隔离层 2. 墙柱面装饰 吸音板墙面	符合要求 符合要求	符合

政府采购项目抽检验收报告

报告编号: 135006774


第 8 页 共 9 页

6	实木装饰门(实木门框、门扇;五金全套) 1.单开、双开共 18 樘	1. 单开、双开共 18 樘	共 14 樘 数量和合同不符	不符合
7	装饰灯 1 1.筒形钢架灯安装	1. 筒形钢架灯安装	符合要求	符合
8	荧光灯 1 1.吸顶式 双管荧光灯具安装、T5 灯管、300*1200 灯盘	1. 吸顶式 双管荧光灯具安装、T5 灯管、300*1200 灯盘	现场未发现	——
9	装饰灯 1.天花射灯 35W 配 24° 光学反射角	1. 天花射灯 35W 配 24° 光学反射角	符合要求	符合
10	小电器 1 1.2+3 插座	1. 2+3 插座	符合要求	符合
11	小电器 2 1.D2 双语音数据插座	1. D2 双语音数据插座	符合要求	符合
12	小电器 3 1.TV 插座	1. TV 插座	符合要求	符合
13	电气配线 1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	1 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	符合要求	符合
14	梳妆台(现场定做)成套化妆台	四楼多功能厅 8 套	现场未见	——

四、检测现场照片



图一

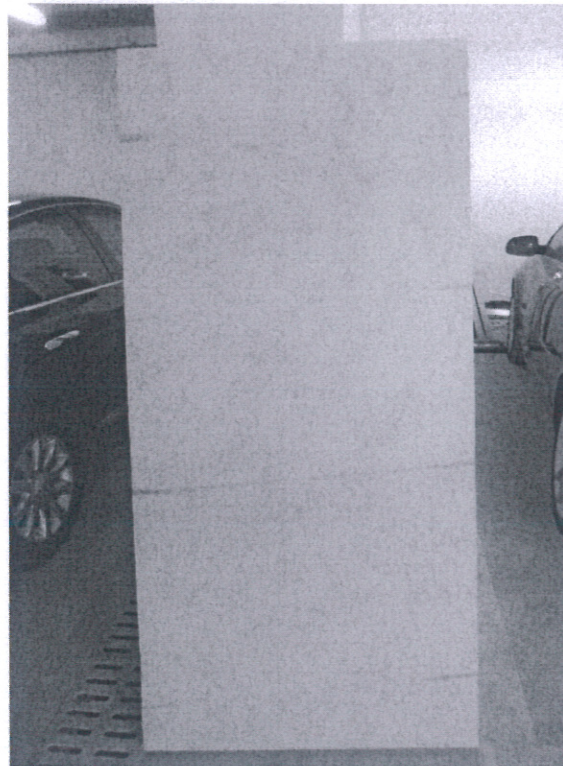

图二

