

文档分类	项目名称	深圳信息职业技术学院宿舍家具	共 13 页
	抽检项目编号	SZCG2015052452	
	采购单位	深圳信息职业技术学院	
	供应商	深圳市富邦顺家具有限公司	
	委托机构	深圳市政府采购中心	
	抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司	
	版 本	V1.0	
	密 级	<input type="checkbox"/> 仅供内部使用 <input checked="" type="checkbox"/> 可对外发布	

深圳市信息职业技术学院宿舍家具 采购项目合同履行评价现场抽检方 案



抽检： 石国根

审核： 吴武杨

批准： 杨位

莱茵技术监护（深圳）有限公司

日期：2015年07月10日



1 抽检总结

项目名称	深圳信息职业技术学院宿舍家具		
采购单位	深圳信息职业技术学院		
供应商	深圳市富邦顺家具有限公司		
委托机构	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2015052452	抽检日期	2015 年 07 月 10 日
抽检地点	深圳信息职业技术学院 A2 宿舍 6-7 楼		
产品名称	宿舍家具一批		
抽检依据	招标文件及政府采购项目抽检方案。		
抽检结果及建议	<p>经现场对已完成交付并安装的产品共计 08 个规格，进行随机抽样检查，发现主要存在以下问题：</p> <p>一、商务要求：</p> <p>1. 现场未提供验收报告；</p> <p>2. 部分产品仍未安装。</p> <p>二、技术要求：部分产品实际测量的技术参数与合同描述不符，涉及序号：</p> <p>1、序号 1 床实际测量尺寸为“2050x964x2150mm”，与合同中所描述尺寸“2050×964×750 mm”不符；床板实际为 18mm 三聚氰胺饰面刨花板，与合同中所描述“床板要求为 18mm 杉木板”不符。</p> <p>2、序号 2 床垫实际外套没有拉链，与合同中所描述“外套带有拉链”不符。</p> <p>3、序号 3 衣柜实际内侧顶板的实际厚度为 17mm，与合同中所描述“刨花板厚度不小于 25mm”不符；实际铰链为无字唛，与测试报告“SZF-XY-15060201-03 铰链有字唛”不符；实际拉手为不锈钢，与合同中所描述“铝合金拉手”不符；扁形铝合金 29x14mm 挂衣衣通，与合同中所描述为“铝合金Φ19 挂衣衣通”不符。</p> <p>4、序号 4 书桌刨花板实际厚度为 24.06-24.17，与合同中所描述“刨花板厚度不小于 25mm”不符；书桌实际结构为不可脱离床架单独使用，与合同中所描述“书桌可脱离床架单独使用”不符；三节路轨实际颜色为黑色，与检验报告上图片颜色为“金属原色”不符；抽屉实际为铁片扣件，与合同中所描述“抽屉均带机械锁具”不符。</p> <p>5、序号 5 书椅实际测量尺寸 535x505x735mm，与合同中所描述“535×505×750 mm”不符。</p>		

2 抽检内容

2.1 检验的货物名称、数量与技术要求：

-宿舍家具配置数量

-宿舍家具尺寸

序号	货物名称	规格	合同数量	分布区域	检验总数 量(个)	抽检数 量	备注
1	床	2050×964×750 mm	784 个	深圳信息职业技术学院 A2 宿舍 5-10 楼	依照送货签收清单上的签收数量，但是仍有部分产品正在安装和未安装，所以现场实际数量无法核对。	2	现场随机从 A2 宿舍楼 6 层和 7 层各抽取一套已完成安装的产品检验（共 16 套）
2	床垫	2000×900×100 mm	1064 个			2	
3	衣柜	798W×612D×1700H mm	784 个			2	
4	书桌	945×596×750 mm	784 个			2	
5	书椅	535×505×750 mm	784 把			2	
6	金属梯	挂高 1866 mm	392 个			2	
7	组合床支架	DYY-C4	784 个			2	
8	组合件	DYY-C1	784 组			2	

2.2商务要求：

商务条款				
序号		合同要求	现场抽检	结论
1	交付期及货物交付的条件	交货时间：签订合同（2015年5月20日）后30个日历日	送货签收清单日期2015年6月30日	符合
		供应商应按照校方指定地点免费送货和卸货并安装	部分产品仍未安装和正在安装	不符合
2	数量、规格型号、性能	应符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。	详细请参见后续的列表	不适用

2.3 招投标技术规格要求：（所有注明尺寸均指实测尺寸，单位为毫米（mm））


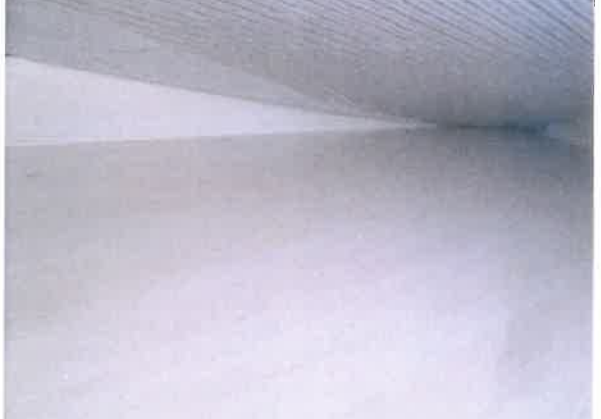


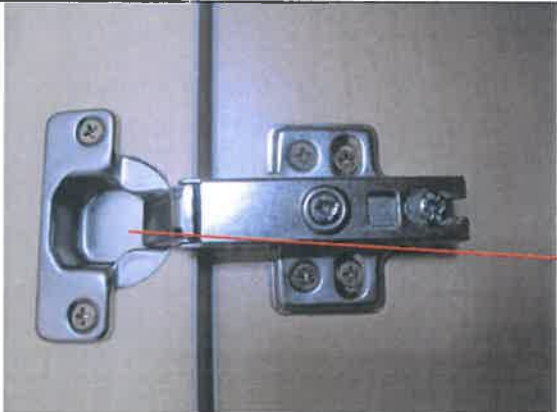
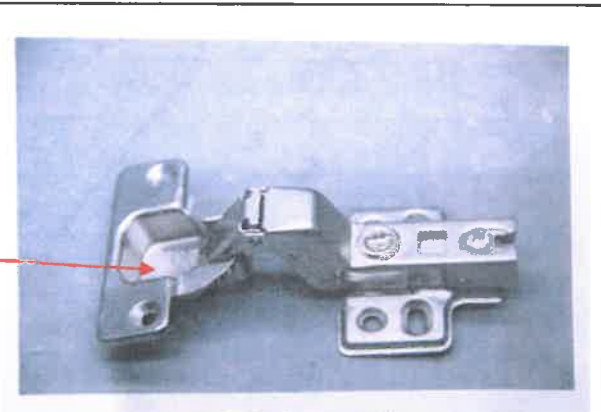
序号	样品名称	技术及规格要求	实测结果	单项判定
1	床	尺寸：2050×964×750 mm	2050x964x2150mm	不符合
		材料要求： 三聚氰胺饰面刨花板；厚度不小于 25mm。2mm 的 PVC 封边。	符合	符合
		结构要求 (采购需求文件)该床可拆分为一个高 750mm 的单人低床，也可以通过以连接件将床与加高板连接的方式，整体加高，变为高架床。 (合同)该床为整板床板，为不可拆卸结构的高价床。	实际结构为不可拆分的 215cm 高的单人床	不符合
		床板要求为 18mm 杉木板，水性漆饰面。	实际为三聚氰胺饰面刨花板	不符合
2	床垫	尺寸：2000×900×100 mm	200x900x100	符合
		基材选用天然环保优质棕垫及优质棕丝；环保均符合国家要求	现场不能提供测试报告	不适用
		无杂质和其它异物且干燥、清洁、无结块、无潮湿、无霉点、无异味、无灰尘；外包面料选用耐磨耐脏棉质料。 缝线：各部位线路顺直，缝线	符合	符合

		松紧适度,不打皱、无浮线、漏针、缝纫不允许有损伤。		
		外观:表面平整,四边平直、对称不偏斜,无明现的露位,不准外翘,填充物厚薄均匀。	符合	符合
		外包布要求使用优质布料。外套带有拉链,能拆卸清洗。	外套没有拉链	不符合
3	衣柜	尺寸:798W×612D×1700H mm	825x960x1700mm	符合
		材料要求: 三聚氰胺饰面刨花板,	依照检验报告 SZF-CY-15-62302-01	符合
		厚度不小于 25mm。 2mm 的 PVC 封边。	内侧顶板的实际厚度为 17mm	不符合
		结构要求 衣柜的侧板与高架床的支撑板共用	符合	符合
		功能要求 (1) 衣柜采用缓冲铰链,档次不低于海富乐、海蒂诗等品牌。	实际铰链为无字唛,测试报告 SZF-XY-15060201-03 铰链有	不符合
		铝合金拉手。	实际拉手为不锈钢	不符合
		内含铝合金 $\phi 19$ 挂衣衣通一根。	扁形铝合金 29x14mm 挂衣衣通	不符合
		(2) 为打开衣柜柜门内的功能设置,三层层板	符合	符合
4	书桌	尺寸:945×596×750 mm	960x620x750	符合

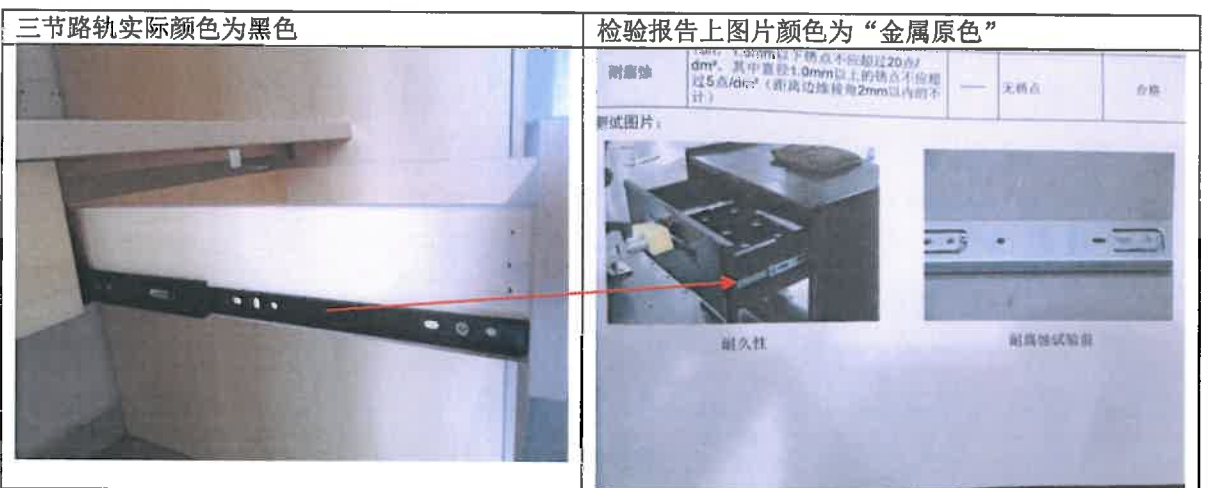
		材料要求: 三聚氰胺饰面刨花板,	依照检验报告 SZF-CY-15-62302-01	符合
		厚度不小于 25mm。	实际厚度为 24.06mm ; 24.17mm	不符合
		2mm 的 PVC 封边。	符合	符合
		结构要求 书桌可脱离床架单独使用。	书桌不可脱离床架单独使用	不符合
		功能要求 (1)两个抽屉柜,	符合	符合
		采用三节路轨。	三节路轨实际颜色为黑色, 检验报告上图片颜色为金属原色	不符合
		均带机械锁具。	实际为铁片扣件	不符合
		(2)台面有出线孔, 塑胶材质, 孔内 PVC 封边。	符合	符合
5	书椅	尺寸: 535×505×750 mm	535x505x735mm	不符合
		材料要求 靠背为塑料, 冲孔。座面为塑胶底板, 定型平面。 框架为钢管, 管径不小于 16mm, 壁厚不小于 1.2mm	符合	符合
		功能 可叠擦。4 个 PU 脚垫。	符合	符合
6	金属梯	挂高 1866 mm	实际挂高为 1890mm	符合
		材料要求: 方管, 截面尺寸为 40*20*1.0, 冷轧钢, 静电喷涂	符合	符合

		床梯须与床框以连接件紧固连接	符合	符合
7	组合床支架	材料要求： 三聚氰胺饰面刨花板。	依照检验报告 SZF-CY-15- 62302-01	符合
		2mm 的 PVC 封边	符合	符合
		功能 功能划分如图所示。 写字台的背面与右边的支架兼 收纳柜,分别为上两个空格 柜、三层板柜	符合	符合
		中间的层板高度与写字台平齐	符合	符合
8	组合件	材料要求： 三聚氰胺饰面刨花板。	依照检验报告 SZF-CY-15- 62302-01	符合
		2mm 的 PVC 封边	符合	符合
		功能 功能划分如图所示。 写字台的背面与右边的支架兼 收纳柜,分别为上两个空格 柜、三层板柜	符合	符合
		中间的层板高度与写字台平齐	符合	符合

不符合项照片

床实际测量尺寸为“2050x964x2150mm	床板实际为三聚氰胺饰面刨花板
	
床垫实际外套没有拉链	衣柜实际内侧顶板的实际厚度为 17mm
	
衣柜实际铰链为无字唛	测试报告“SZF-XY-15060201-03 铰链有字唛”不符
	

不符合项照片



不符合项照片



抽检照片



抽检照片

